




# ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "BENEDETTO CROCE"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane Opz. Economico Sociale  
Liceo Linguistico - Liceo Musicale

Via G. D'Annunzio - 09170 Oristano - tel. 0783 70287 - FAX 0783 302648 - Cod. Fisc. 80006570958

Codice Istituto: ORPM01000T - e-mail: orpm01000t@istruzione.it - PEC: orpm01000t@pec.istruzione.it - WEB: https://www.magicroce.edu.it




Servizio di Prevenzione e Protezione  
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Modulo n° SPP/02 rev. 00

## RELAZIONE S.P.P. Aggiornamento ed integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) A.S. 2020/2021

Datore di lavoro	Prof. SALVATORE MARESCA - Datore di Lavoro (DdL)
R.S.P.P.	Ing. Roberto ZOCCHEDDU - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
P.c.c.	<input type="checkbox"/> Dott.ssa Carmen PANICO / Medico Competente (MC)
P.c.c.	<input type="checkbox"/> Prof. Paolo SCARTEDDU / Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Oggetto:	AVVIO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI CORNICIONI
Azione da eseguire:	COMUNICAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO ED AGLI ALUNNI


In data 12 ottobre 2020 inizieranno i lavori di ripristino dei cornicioni e alcuni elementi di facciata. Tali lavori, commissionati dalla provincia di Oristano - Servizio progettazione e gestione edilizia scolastica ed istituzionale - saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice Costruzioni Dario Isola di Quartu S. Elena sotto la direzione lavori dell'ing. Alessandro Corrias, il quale sarà anche coordinatore per la sicurezza dei lavori. I lavori riguarderanno il perimetro del corpo "A" dell'edificio scolastico, comprenderanno la realizzazione di un ponteggio su tre lati (zone F2) per l'accesso alla copertura e prevedono l'intervento di una piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) per gli interventi su alcune parti dell'edificio (zona F1). Si riporta di seguito la planimetria generale dell'intervento:

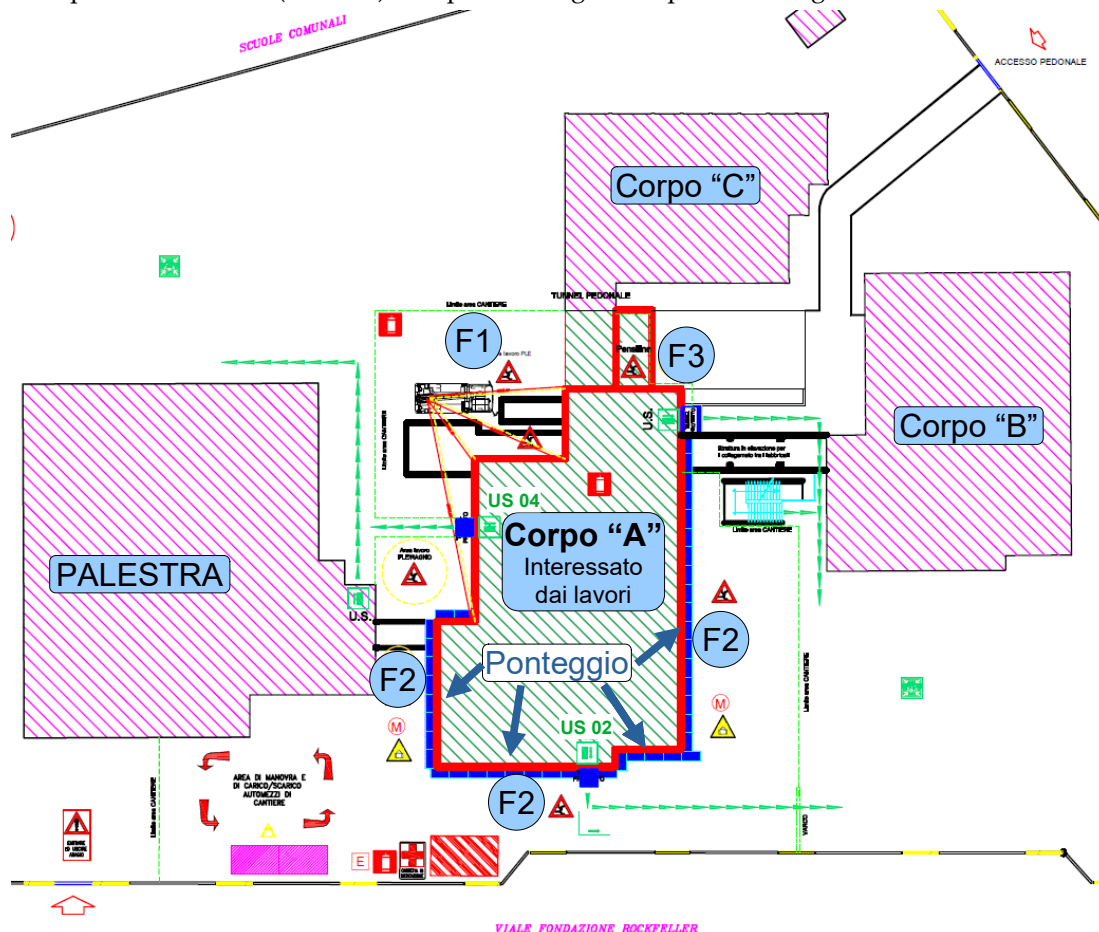

Nella zona indicata con F3 (ingresso principale) saranno eseguite lavorazioni sospese con uso delle funi per evitare l'uso della PLE. Tale specifico intervento sull'ingresso avverrà secondo modalità e tempi concordati dalla Direzione Lavori con il Dirigente scolastico.

Secondo quanto comunicato dall'ing. Corrias, le lavorazioni avranno inizio in data 12/10/2020 con:


1. la predisposizione delle recinzioni e delle delimitazioni dell'area di cantiere;
2. l'affissione di idonea cartellonistica, comprendente quella specifica per le misure anti COVID-19 secondo i dettami degli ultimi DPCM;
3. la predisposizione dei tunnel protetti per le uscite di emergenza dal piano terra del corpo interessato dai lavori (zona uffici-laboratori); tali uscite sono quelle alla fine del corridoio prospiciente la via Rockefeller (US 02) e del laboratorio di chimica (US 04); i percorsi esterni in corrispondenza di tali uscite dovranno essere tenuti sempre sgombri da materiali ed attrezzature a cura dell'impresa;

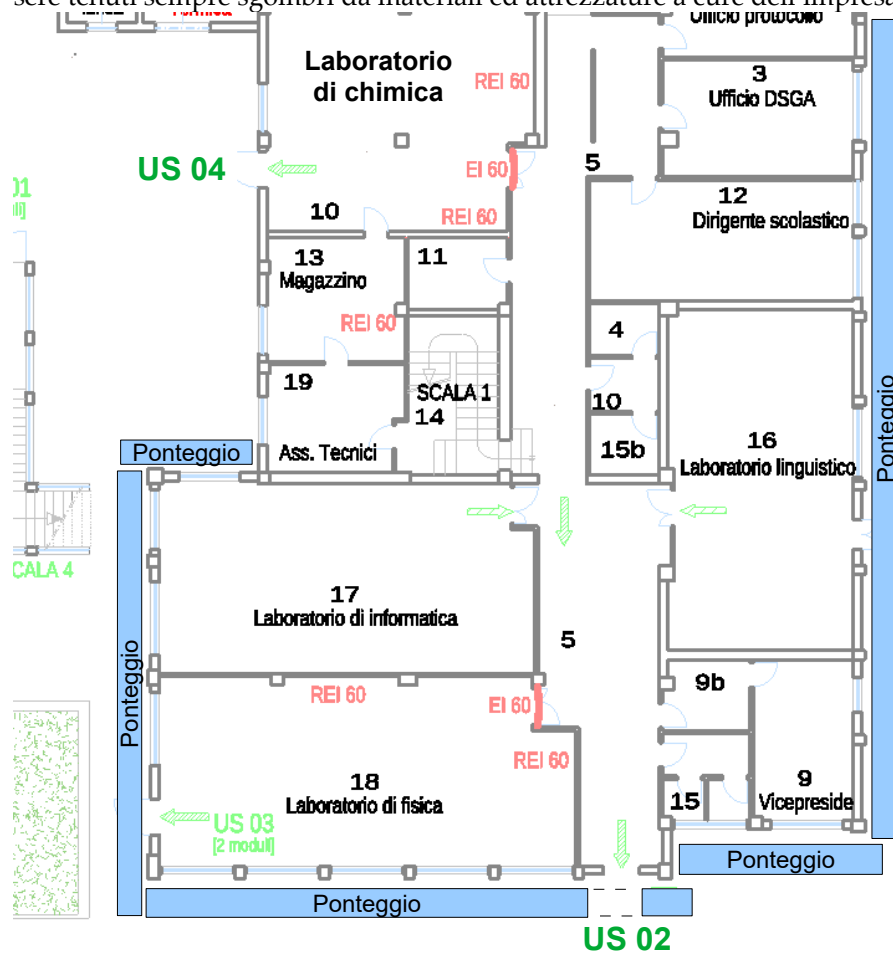

4. l'esecuzione degli allacci impiantistici a servizio del cantiere (idrico ed elettrico);
5. la predisposizione delle opere provvisorie e del ponteggio (rappresentato in BLU nella figura in prima pagina);
6. l'approvvigionamento dei materiali.

## Misure di prevenzione e protezione rivolte al personale scolastico ed agli alunni

- A) Il cantiere sarà adeguatamente recintato e chiaramente delimitato. È fatto divieto a chiunque non sia autorizzato di entrare nelle aree di cantiere. Sarà fatta eccezione, per quanto riguarda l'uscita US 02 il cui percorso interessa un porzione dell'area di cantiere, solo in caso di effettiva emergenza.
- B) L'accesso dei mezzi di cantiere avverrà dal cancello prospiciente la via Rockefeller, in orari non coincidenti con quelli di ingresso ed uscita di studenti e personale scolastico.
- C) Nella giornata di lunedì 12 ottobre, in occasione delle lavorazioni per l'installazione del cantiere, dovrà essere evitato il parcheggio, oltre che nell'area destinata al cantiere, anche nell'area a lato dell'ingresso della palestra per agevolare la manovra dei mezzi, che avverrà in ogni caso sotto la sorveglianza del personale dell'impresa opportunamente disposto;

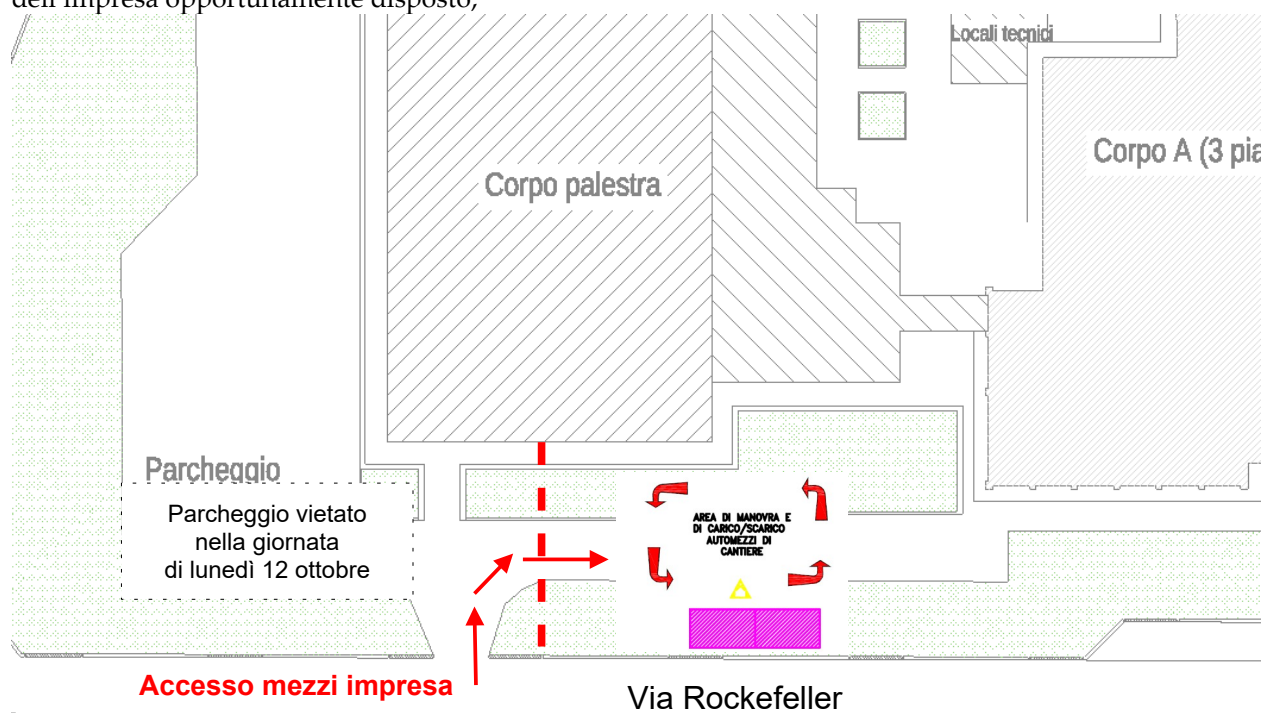

- D) Ai fini delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici, non sono previsti contatti o interazioni tra personale scolastico e personale dell'impresa esecutrice.

*Il Responsabile del Servizio  
di Prevenzione e Protezione (RSPP)*

**Ing. Roberto Zoccheddu**

